


FASERING OOSTZIJDE

FASE 1: MEDIO NOVEMBER – EIND NOVEMBER 2021

- Werkerrein inrichten
- Verwijderen meubilair, afrastering, bomen en beplanting
- Grond uitgraven uit bekleding en ter plaatse van te realiseren zandgraven
- Aanbrengen tijdelijke brug voor ingang bouwterrein

Te verwachten hinder:

- Vrachtwagens in de straat, voor het brengen en halen van materiaal
- Heel het traject, omleiding door inrit bouwterrein

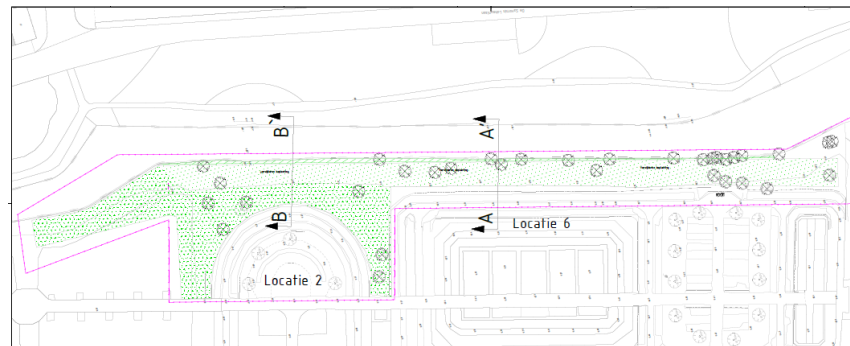


FASE 2: EIND NOVEMBER – EIND DECEMBER 2021

- Uitvlakken werkerrein
- Heisleuf schoonmaken
- Aanbrengen damwand met de Funderingskraan en elektrische trilblok
- Verankering aanbrengen door Jetmix

Te verwachten hinder:

- Vrachtwagens in de straat voor het aanleveren van damwand
- Verder bevinden alle werkzaamheden zich op het bouwterrein


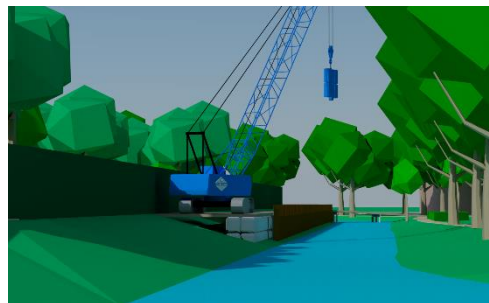


FASE 3: BEGIN JANUARI 2022 – MEDIO DECEMBER 2022

- Aanbrengen ophoogslag voor extra belasting
- Zettingsperiode
- Verwijderen ophoogslag
- Verwijderen big bags

Te verwachten machines:

- Vrachtwagens in de straat voor het aanleveren van zand

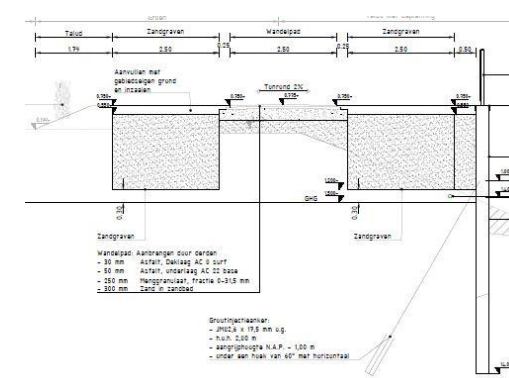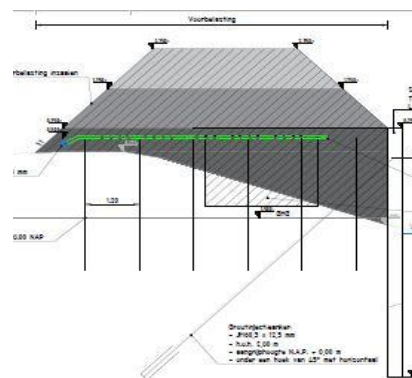

FASE 4: MEDIO DECEMBER 2022 – BEGIN FEBRUARI 2023

- Aanbrengen deksloof en hekwerk
- Egaliseren en inzaaien

Te verwachten machines:

- Vrachtwagen voor levering hekwerk en afvoer bouwterrein
- Verder alle werkzaamheden binnen het bouwterrein
